

Ruisseau de chez Gerbeau


Fiche N°3

Maître d'ouvrage : SIAH du Sud Charente : bassins Tude et Dronne (16)

Date des travaux : Hiver 2014

Contact pour tout renseignement sur ce projet : Gaël PANNETIER 06.16.52.26.78

Aménagement N°3

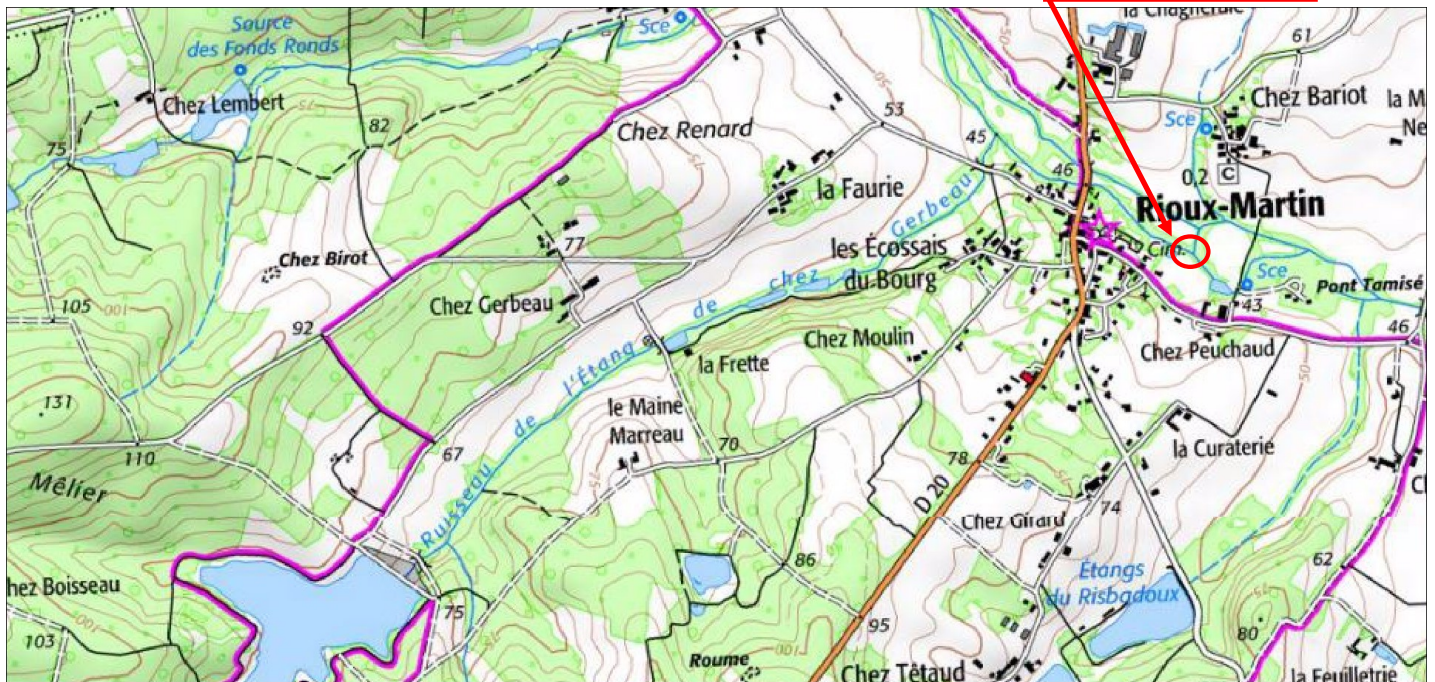

	Avant travaux	Après Travaux
Constat	Ouvrage difficilement franchissable.	Ouvrage franchissable.
Détermination des causes des dysfonctionnements et conséquences sur le milieu	Interventions humaine non appropriées qui ont engendré des difficultés de franchissement sous ce pont artisanal qui a remplacé un ancien gué empierré.	L'aménagement a permis de résoudre les problèmes de franchissement à toutes les périodes de l'année.
Distance depuis la Confluence	60m	60m
Objectifs à atteindre	Rendre franchissable ce secteur.	Objectif atteint.
Travaux à réaliser	Faire de la recharge granulométrique afin d'éviter des phénomènes d'érosion régressive et permettre aux espèces piscicole de franchir ce point.	Recharge faite en aval de l'ouvrage : OUI Apport de matériaux sur plusieurs dizaines de mètres pour effacer la pente et la chute engendré par l'ouvrage.
Aspects administratifs	DIG en cours et déclaration de travaux.	
Quantité et Coût estimatifs	10m ³ = 20t	Galet remblai = 10t Coût = 300.20€ ht

Avant travaux en hautes eaux : Aval du ponceau



Après travaux : Aval du pont en basses eaux

